

INFORMASI KEGIATAN T.A 2021



Status : September 2021

No	Nama Paket	Status	Lokasi Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	No kontrak, tgl	Nama Penyedia Jasa	Progres Rencana (%)	Progres Realisasi (%)	Progres Keuangan (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	Kontrak	Kab. Solok	27.389.457.000,00	17.751.091.655,92	620/73/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Arpep Primadhamor	28,630	19,950	25,020	
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098) DAK	Kontrak	Kota Padang	10.340.000.000,00	8.026.585.162,34	620/04/KTR-BM/2021, 05 Mei 2021	PT. SARANA MITRA SAUDARA	23,956	34,851	20,000	
3	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) DAK	Kontrak	Kab.Padang Pariaman	5.000.000.000,00	3.958.121.195,11	620/76/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT. Anugrah Karya Bersama Persada	32,920	37,200	41,300	
4	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) DAK	Kontrak	Kab.Solok	10.495.818.000,00	7.720.293.310,18	620/79/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Arpep Primadhamor	34,698	30,714	29,690	
5	Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	33.210.200.000,00	27.056.823.481,07	620/03/KTR-PHJD-BM/2021, 30 April 2021	PT. ANUGRAH TRIPA RAYA	76,899	76,989	58,742	
6	Paket 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	Kontrak	Kab. Solok	18.000.000.000,00	14.173.608.329,61	620/06/KTR-PHJD-BM/2021, 30 April 2021	PT BUNGA MAS PERKASA	71,630	68,850	53,530	
7	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	2.920.780.000,00	2.363.214.337,63	630/64/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT. Kamala Unida	28,370	24,300	20,000	
8	Pembangunan Jembatan Sikali (P.084)	Kontrak	Payakumbuh	4.416.500.000,00	3.474.280.718,78	630/93/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. TEWANG JAYA KONSTRUKSI	13,490	17,053	20,000	
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Provinsi	Kontrak	Sumatera Barat	1.663.968.000,00	1.227.711.893,35	620/40/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. JAYA BUMI PERKASA	93,110	90,500	30,000	
10	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)	Kontrak	Kab. Solok	3.877.942.176,00	3.247.186.536,17	620/43/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. PRATAMA PUTRA SEJAHTERA	14,810	23,120	20,000	
11	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	Kontrak	Kota Sawahlunto	4.937.889.000,00	3.871.883.855,20	620/149/KTR-BM/2021, 26 Agustus 2021	CV. PUTRI PRATAMA	17,210	19,440	20,000	
12	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi (P.102)	Kontrak	Kab. Solok & Kota Sawahlunto	2.898.077.550,00	2.482.242.671,96	620/105/KTR-BM/2021, 25 Juni 2021	PT. OMBILIN CIPTA NUSA	50,318	70,386	48,670	
13	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	6.417.398.400,00	5.139.183.888,88	620/19/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	23,160	33,120	20,000	
14	Rekonstruksi jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008)	Kontrak	Kab. Sijunjung	11.895.535.600,00	8.502.855.011,92	620/59/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	49,850	51,140	20,000	
15	Penggantian Jembatan Batang Tiung (P.010)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	4.415.550.000,00	3.532.216.182,99	630/67/KTR-BM/2021, 17 Juni 2021	PT. LASKAR MUDA GEMILANG	52,830	49,600	20,000	
16	Penggantian Jembatan Tiku (P.072)	Kontrak	Kab.Padang Pariaman	6.073.530.000,00	4.569.099.121,58	630/70/KTR-BM/2021, 17 Juni 2021	PT. INSAN KARYA TAMA	37,540	48,640	20,000	
17	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	3.143.316.695,00	2.550.664.182,10	620/53/KTR-BM/2021, 11 Juni 2021	PT BUNGA MAS PERKASA	96,110	96,870	20,000	
18	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096)	Kontrak	Kab. Pasaman	2.954.902.600,00	2.362.354.000,00	620/22/KTR-BM/2021, 07 Juni 2021	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	90,030	86,830	20,000	
19	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	5.455.204.800,00	4.367.625.327,15	620/16/KTR- BM/2021, 07 Juni 2021	PT. PASAGAM TENAGA PERKASA	46,440	47,250	39,480	
20	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	1.331.775.000,00	1.103.867.568,80	630/37/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. KARYA MINANG KONSTRUKSI	100,000	100,000	86,547	
21	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	Kontrak	Kab. Agam	2.921.057.500,00	2.331.911.455,07	620/13/KTR- BM/2021, 7 Juni 2021	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	64,400	61,110	20,000	
22	Rekonstruksi Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	Kontrak	Kab. Solok Selatan	2.444.240.200,00	1.826.388.588,22	620/46/KTR-BM/2021, 8 Juni 2021	CV. BYVAN TRIDAYA PERDANA	36,870	50,000	30,000	
23	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)	Kontrak	Kab. 50 Kota	4.942.704.000,00	3.795.826.924,09	620/56/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT Sadewa karya Tama	10,990	15,299	20,000	
24	Rekonstruksi Jalan Matur - Palembang (P.080)	Kontrak	Kab. Agam	1.350.000.000,00	1.076.092.909,08	620/102/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. APACONT JAYA ABADI	51,500	80,550	55,920	

No	Nama Paket	Status	Lokasi Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	No kontrak, tgl	Nama Penyedia Jasa	Progres Rencana (%)	Progres Realisasi (%)	Progres Keuangan (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
25	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	Kontrak	Kota Payakumbuh	994.402.010,00	794.309.821,65	620/90/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	100,000	100,000	30,000	
26	Pelebaran menuju standar ruas Jalan Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	Kontrak	Kab. Tanah Datar	2.409.575.520,00	1.803.433.267,55	620/87/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. PENGUSAHA MUDA	33,750	36,670	30,000	
27	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	4.938.852.750,00	3.901.648.410,65	620/96/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. DAFFA ARJUNA PRATAMA	21,350	24,886	20,000	
28	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	Kontrak	Kab. 50 Kota	2.443.477.150,00	1.874.328.259,65	620/84/KTR-BM/2021, 22 Juni 2021	CV. CITRA ANUGERAH PUTRA	19,057	34,173	30,000	
29	Rekonstruksi jalan Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru (P.010)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	1.988.804.020,00	1.766.696.562,63	620/108/KTR-BM/2021, 2 Juli 2021	CV. TEWANG KARYA KHAIFARO	20,240	40,550	30,000	
30	Pelebaran menuju standar ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	Kontrak	Kab. Agam	1.800.689.275,00	1.344.861.402,08	620/99/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. TATA KARYA PRATAMA	10,700	7,140	30,000	
31	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	Kontrak	Kab. Agam	1.988.876.750,00	1.914.344.382,60	620/114/KTR-BM/2021, 13 Juli 2021	cv.kulam scuedetto	25,410	23,000	30,000	
32	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) (P.036)	Kontrak	Kab. Tanah Datar	785.568.000,00	612.293.090,79	620/134/KTR-BM/2021, 13 Agustus 2021	CV. PUTRA BUMI KHATULISTIWA	36,04	36,07	30,000	
33	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis (P.034)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	737.500.000,00	589.991.128,32	620/111/KTR-BM/2021, 13 Juli 2021	CV. KARYA PASTIKA MULTIGUNA	16,530	31,800	30,000	
34	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai (P.018)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	443.925.000,00	415.188.172,91	620/131/KTR-BM/2021, 13 Agustus 2021	CV. NISA KONSTRUKSI	4,120	5,090	30,000	
35	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	1.328.670.000,00	1.062.478.890,62	620/121/KTR-BM/2021, 28 Juli 2021	CV. RIFANI KARYA	4,660	5,460	30,000	
36	Pemeliharaan Berkala Simp. Koto Baru - Junction (P.012)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	941.568.690,00	794.908.821,31	620/128/KTR-BM/2021, 9 Agustus 2021	CV. ADFAN KARYA	13,377	7,945	30,000	
37	Penggantian Jembatan Pulau Air (P.098)	Belum Proses	Kota Padang	1.681.803.600,00							
38	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	Kontrak	Kab. Solok	600.000.000,00	554.048.000,00	620/51/KTR-PGWS-BM/2021, 11 Juni 2021	CV. JASA REKA MANDIRI CONSULTANT	31,930	31,930	20,000	
39	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098) DAK	Kontrak	Padang	600.000.000,00	Rp. 506.724.900,00	620/09/KTR-PGWS-BM/2021, 27 Mei 2021	CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING	43,090	43,090	20,000	
40	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) DAK	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	350.000.000,00	325.105.000,00	630/82/KTR-PGWS-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Parades Karya Consultant	57,030	61,400	20,000	
41	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Singkarak - Aripin - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) DAK	Kontrak	Kab. Solok	425.000.000,00	369.831.000,00	630/35/KTR-PGWS-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Taru Nusantara	12,234	21,649	20,000	
42	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD) Tahap II	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan & Kab. Solok	2.000.000.000,00	1.767.091.800,00	620/09/KTR-PHJD-BM/2021, 10 Mei 2021	KSO Dasa Mandiri	48,930	48,930	20,000	
43	Pengawasan Pembangunan Jembatan Provinsi	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan & Payakumbuh	369.717.000,00	Rp. 345.636.500,00	620/62/KTR-PGWS-BM/2021, 15 Juni 2021	CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT	30,600	30,600	20,000	
44	Pengawasan Penggantian Jembatan Provinsi	Kontrak	Sumatera Barat	466.325.000,00	444.693.700,00	630/31/KTR-PGWS-BM/2021, 7 Juni 2021	CV. Karahoshitama	46,670	0,00	20,000	
45	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi	Kontrak	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan	630.545.000,00	Rp. 593.714.000,00	620/11/KTR-PGWS-BM/2021, 07 Juni 2021	CV. IRVOTEC RIAU CONSULTANT	61,270	61,270	20,000	

FOTO PELAKSANAAN PAKET 1

Ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073)

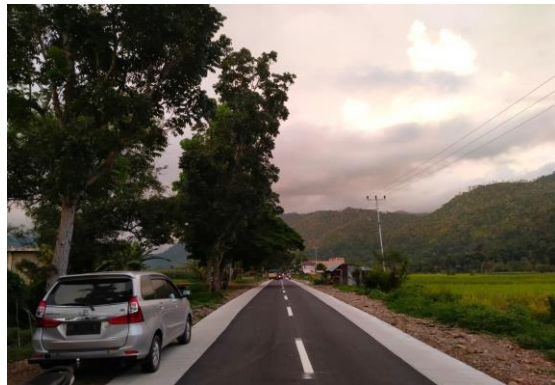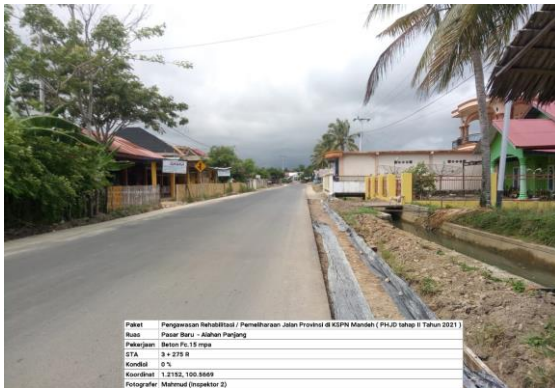

Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan (P.083)



FOTO PELAKSANAAN PAKET 1

Ruas Jalan Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)



Ruas Jalan Batu Batembak-Pelabuhan Panasahan (P.100)



FOTO PELAKSANAAN PAKET 2

Ruas Jalan Solok – Alahan Panjang (P.071)

